Vypracoval : Ing. Petr Klement
Datum : 31.10.2008
Aktualizace číslo : 4

**Časový harmonogram postupu provedení díla**

# Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

## 7A Kobylí ČOV
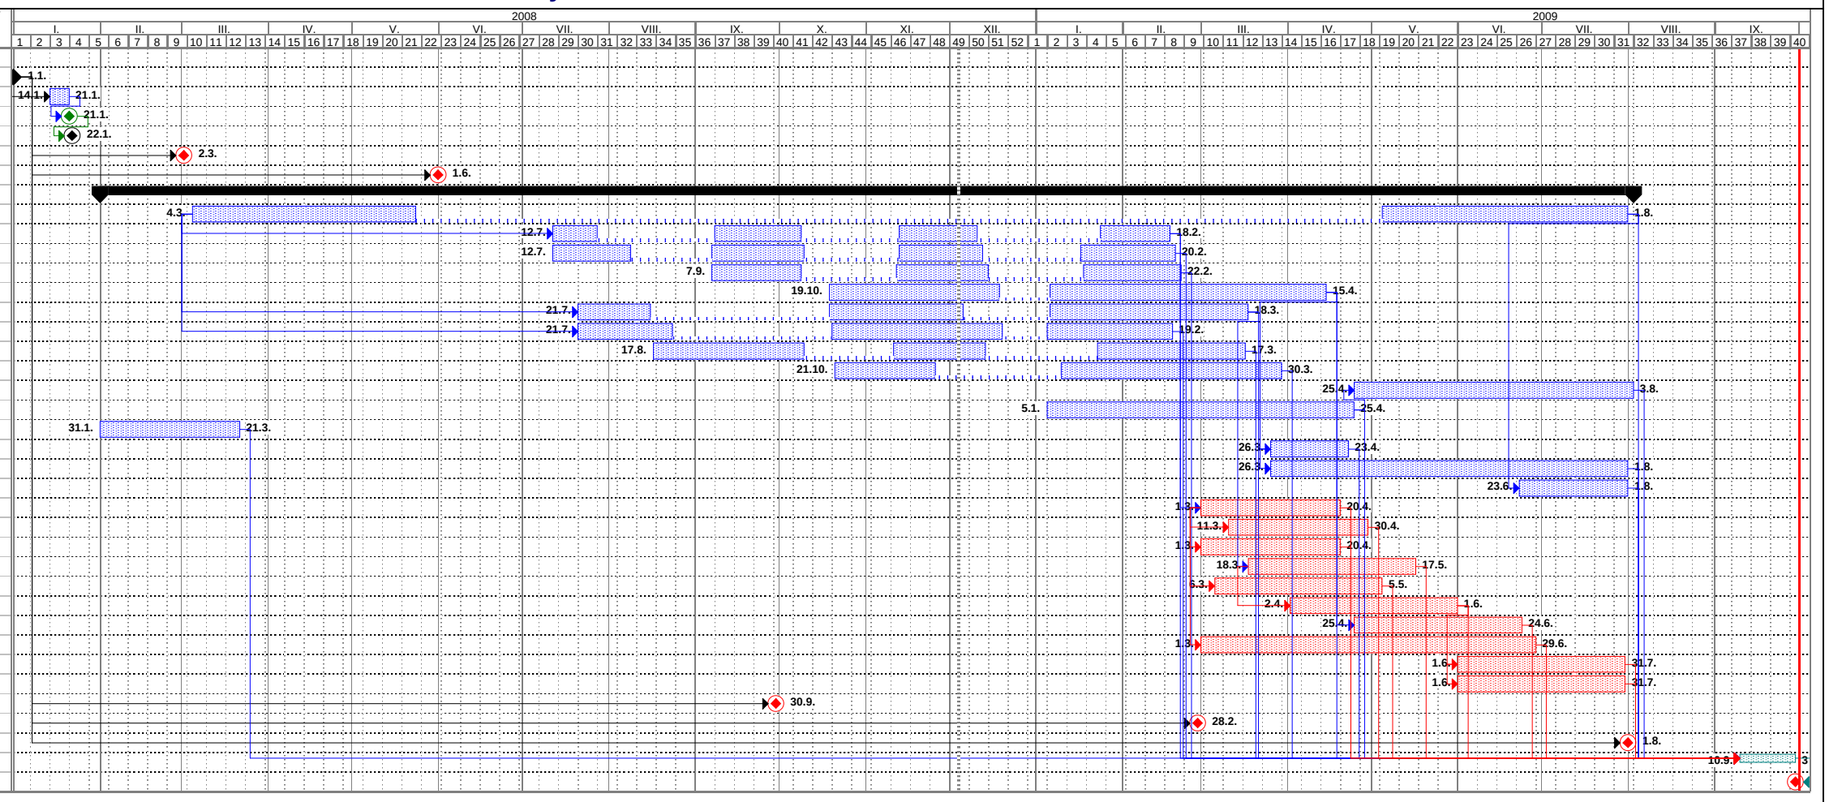
| ID | Název úkolu | Množství | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Uzavření SOD** | | **0 dny** | 4.6. 07 | 4.6. 07 |
| 2 | **Výzva k zahájení prací objednatelem - v plném rozsahu** | | 0 dny | 1.1. 08 | 1.1. 08 |
| 3 | **Zařízení staveniště** | | **7 dny** | 14.1. 08 | 21.1. 08 |
| 4 | **Předání staveniště** | | **0 dny** | 21.1. 08 | 21.1. 08 |
| 5 | **Zahájení prací** | | 0 dny | 22.1. 08 | 22.1. 08 |
| 6 | **Milník číslo 1 - realiz. dokumentace 1 část schválena správcem sta** | | **0 dny** | 2.3. 08 | 2.3. 08 |
| 7 | **Milník číslo 2 - realiz. dokumentace 2 část schválena správcem sta** | | **0 dny** | 1.6. 08 | 1.6. 08 |
| 8 | **7A KOBYLÍ - ČOV, SOUČET** | | **549,63 dny** | **31.1. 08** | **3.8. 09** |
| 9 | **SO 7A.001 Příprava staveniště, terénní a sadové úpravy** | | **168 dny** | 4.3. 08 | 1.8. 09 |
| 10 | **SO 7A.002 Hrubé předčištění** | | **100 dny** | 12.7. 08 | 18.2. 09 |
| 11 | **SO 7A.003 Čerpací stanice** | | **125 dny** | 12.7. 08 | 20.2. 09 |
| 12 | **SO 7A.004 Dešťová zdrž** | | **100 dny** | 7.9. 08 | 22.2. 09 |
| 13 | **SO 7A.005 Provozní budova, dmychárna, odvětrání** | | **160 dny** | 19.10. 08 | 15.4. 09 |
| 14 | **SO 7A.006 Selektor** | | **145 dny** | 21.7. 08 | 18.3. 09 |
| 15 | **SO 7A.007 Biologická linka** | | **140 dny** | **21.7. 08** | **19.2. 09** |
| 16 | **SO 7A.008 Kalojemy** | | **140 dny** | 17.8. 08 | 17.3. 09 |
| 17 | **SO 7A.009 Kanalizace a trubní rozvody v ČOV** | | **115 dny** | 21.10. 08 | 30.3. 09 |
| 18 | **SO 7A.010 Komunikace v ČOV** | | **100 dny** | 25.4. 09 | 3.8. 09 |
| 19 | **SO 7A.011 Přípojka vody** | | **110 dny** | 5.1. 09 | 25.4. 09 |
| 20 | **SO 7A.012 Přípojka VN a trafostanice** | | **50 dny** | 31.1. 08 | 21.3. 08 |
| 21 | **SO 7A.013 Přípojka NN** | | **28 dny** | 26.3. 09 | 23.4. 09 |
| 22 | **SO 7A.014 Stavební elektroinstalace, venk.osvětlení** | | **128 dny** | 26.3. 09 | 1.8. 09 |
| 23 | **SO 7A.015 Oplocení** | | **39 dny** | 23.6. 09 | 1.8. 09 |
| 24 | **PS 7A.101 Hrubé předčištění a ČS** | | **50 dny** | 1.3. 09 | 20.4. 09 |
| 25 | **PS 7A.102 Dešťová zdrž** | | **50 dny** | 11.3. 09 | 30.4. 09 |
| 26 | **PS 7A.103 Mechanické předčištění** | | **50 dny** | 1.3. 09 | 20.4. 09 |
| 27 | **PS 7A.104 Selektor** | | **60 dny** | 18.3. 09 | 17.5. 09 |
| 28 | **PS 7A.105 Biologická linka** | | **60 dny** | 6.3. 09 | 5.5. 09 |
| 29 | **PS 7A.106 Kalojemy** | | **60 dny** | 2.4. 09 | 1.6. 09 |
| 30 | **PS 7A.107 Odvodnění kalu (hygienizace kalu)** | | **60 dny** | 25.4. 09 | 24.6. 09 |
| 31 | **PS 7A.108 Strojní elektroinstalace** | | **120 dny** | 1.3. 09 | 29.6. 09 |
| 32 | **PS 7A.109 MaR** | | **60 dny** | 1.6. 09 | 31.7. 09 |
| 33 | **PS 7A.110 Zabezpečení ČOV a telemechanika** | | **60 dny** | 1.6. 09 | 31.7. 09 |
| 34 | **Milník číslo 3 - rozsah zhotovovacích prací 45 %** | | **0 dny** | 30.9. 08 | 30.9. 08 |
| 35 | **Milník číslo 4 - rozsah zhotovovacích prací 70 %** | | **0 dny** | 28.2. 09 | 28.2. 09 |
| 36 | **Milník číslo 5 - připojení 80 % kanalizačních přípojek** | | **0 dny** | 1.8. 09 | 1.8. 09 |
| 37 | **Předání díla objednateli** | | **20 dny** | 10.9. 09 | 30.9. 09 |
| 38 | **Milník číslo 6 - protokol o předání a převzetí díla** | | **0 dny** | 30.9. 09 | 30.9. 09 |
