Časový harmonogram postupu provedení díla

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

2B Mikulov - kanalizace

Aktualizace 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Uzavření SOD**	**0 dny**	4.6. 07	4.6. 07
2	**Milník číslo 2 - 2.část realizační dokumentace**	**0 dny**	31.1. 08	31.1. 08
3	**Milník číslo 3- 45% zhotovovacích prací**	**0 dny**	30.9. 08	30.9. 08
4	**Milník číslo 4- 70% zhotovovacích prací**	**0 dny**	28.2. 09	28.2. 09
5	**Milník číslo 5- připojrní 80% kanalizačních přípojek**	**0 dny**	30.9. 09	30.9. 09
6	**Milník číslo 6 - protokol o předání a převzetí díla**	**0 dny**	31.10. 09	31.10. 09
7	**SO 2B.001 Sběrač B-Bezručova,Dukelská,U Lomu,22. dubna**	**446 dny**	**25.5. 08**	**14.8. 09**
8	**SO 2B.001/1 Kanalizační stoky**	431 dny	**25.5. 08**	**30.7. 09**
9	**Stoka B 9**	**91 dny**	**25.5. 08**	**24.8. 08**
10	PP DN 400 - U Lomu	91 dny	25.5. 08	24.8. 08
11	PP DN 300 - U Lomu	28 dny	16.6. 08	14.7. 08
12	KT DN 300 - U Lomu	15 dny	15.7. 08	30.7. 08
13	**Stoka B**	**198 dny**	**5.1. 09**	**22.7. 09**
14	SKL DN 600 SN 10000 - Pavlovská	63 dny	5.1. 09	9.3. 09
15	Přepojení stoky B 10 DN 500 - Pavlovská	23 dny	29.6. 09	22.7. 09
16	**Stoka B 2**	**154 dny**	**17.2. 09**	**21.7. 09**
17	KT DN 400 - 22.dubna	154 dny	17.2. 09	21.7. 09
18	**Stoka B 11**	**149,63 dny**	**2.3. 09**	**30.7. 09**
19	KT DN 400 - Bezručova	84 dny	2.3. 09	25.5. 09
20	KT DN 300 - Bezručova	21 dny	8.6. 09	29.6. 09
21	Přepojení stoky B 11a DN 400, B 11b DN 300 - Bezručova	28 dny	29.6. 09	30.7. 09
22	**SO 2B.001/2 Odbočky pro přípojky**	390 dny	**16.6. 08**	**4.8. 09**
23	**SO 2B.001/3, SO 2B.001/4 Opravy komunikace**	300 dny	**24.9. 08**	**14.8. 09**
24	**SO 2B.002 Sběrač C - Ulice K Vápence, Gagarinova**	**150 dny**	**9.4. 08**	**6.9. 08**
25	**SO 2B.002/1 Kanalizační stoky**	**137 dny**	**9.4. 08**	**24.8. 08**
26	Sběrač C - část 1 SKL DN 600 - K Vápence	81 dny	9.4. 08	29.6. 08
27	Sběrač C - část 2 SKL DN 600 - Gagarinova	61 dny	23.6. 08	23.8. 08
28	Odlehčovací stoka OS 5 - K Vápence	82 dny	3.6. 08	24.8. 08
29	**SO 2B.002/2 Odbočky pro přípojky**	90 dny	**22.5. 08**	**20.8. 08**
30	**SO 2B.002/3 Opravy komunikace po výkopech**	52 dny	**16.7. 08**	**6.9. 08**
31	**SO 2B.003 Sběrač D - Ulice Nová**	**265,63 dny**	**8.8. 08**	**1.5. 09**
32	**SO 2B.003/1 Kanalizační stoky**	**132,63 dny**	**8.8. 08**	**19.12. 08**
33	PP DN 400 - Nová ulice	67 dny	8.8. 08	14.10. 08
34	PP DN 300 - Nová ulice	45,63 dny	3.11. 08	19.12. 08
35	**SO 2B.003/2 Odbočky pro přípojky**	118,63 dny	**20.10. 08**	**16.2. 09**
36	**SO 2B.003/3 Opravy komunikace po výkopech**	38,63 dny	**23.3. 09**	**1.5. 09**
37	**SO 2B.004 Přítok na ČOV**	**567,63 dny**	**10.1. 08**	**31.7. 09**
38	**SO 2B.004/1 Kanalizační stoky**	**53 dny**	**5.1. 09**	**27.2. 09**
39	Sběrač B - část I. SKL DN 1000 SN 10000	23 dny	5.1. 09	28.1. 09
40	Rekonstrukce OK 2	32 dny	26.1. 09	27.2. 09
41	**SO 2B.004/2 Objekty na kanalizačních stokách**	**464,63 dny**	**10.1. 08**	**19.4. 09**
42	Spojná komora SK - 1	85 dny	2.9. 08	26.11. 08
43	Odlehčovací komora OK - 1, výustní objekt VO-1	98 dny	10.1. 08	21.11. 08
44	Sběrač A SKL DN 2000 SN 10000	20 dny	4.3. 08	24.3. 08
45	Sběrač A SKL DN 1600 SN 10000	14 dny	14.7. 08	28.7. 08
46	Spádiště SP - 1	60 dny	25.9. 08	24.11. 08
47	Sběrač B - část II. SKL DN 1000 SN 10000	38 dny	19.1. 09	26.2. 09
48	Odlehčovací kanál ŽB 2000x1000	30 dny	25.7. 08	24.8. 08
49	Nátok na ČOV část I. PP DN 300	50 dny	25.7. 08	13.9. 08
50	Nátok na ČOV část II. SKL DN 900 SN 10000	76 dny	2.2. 09	19.4. 09
51	**SO 2B.004/4 Opravy komunikace po výkopech**	85 dny	7.5. 09	31.7. 09
52	**SO 2B.004/3 Přeložky inženýrských sítí**	88 dny	22.10. 08	3.4. 09
53	**Předání díla objednateli**	**0 dny**	31.10. 09	31.10. 09

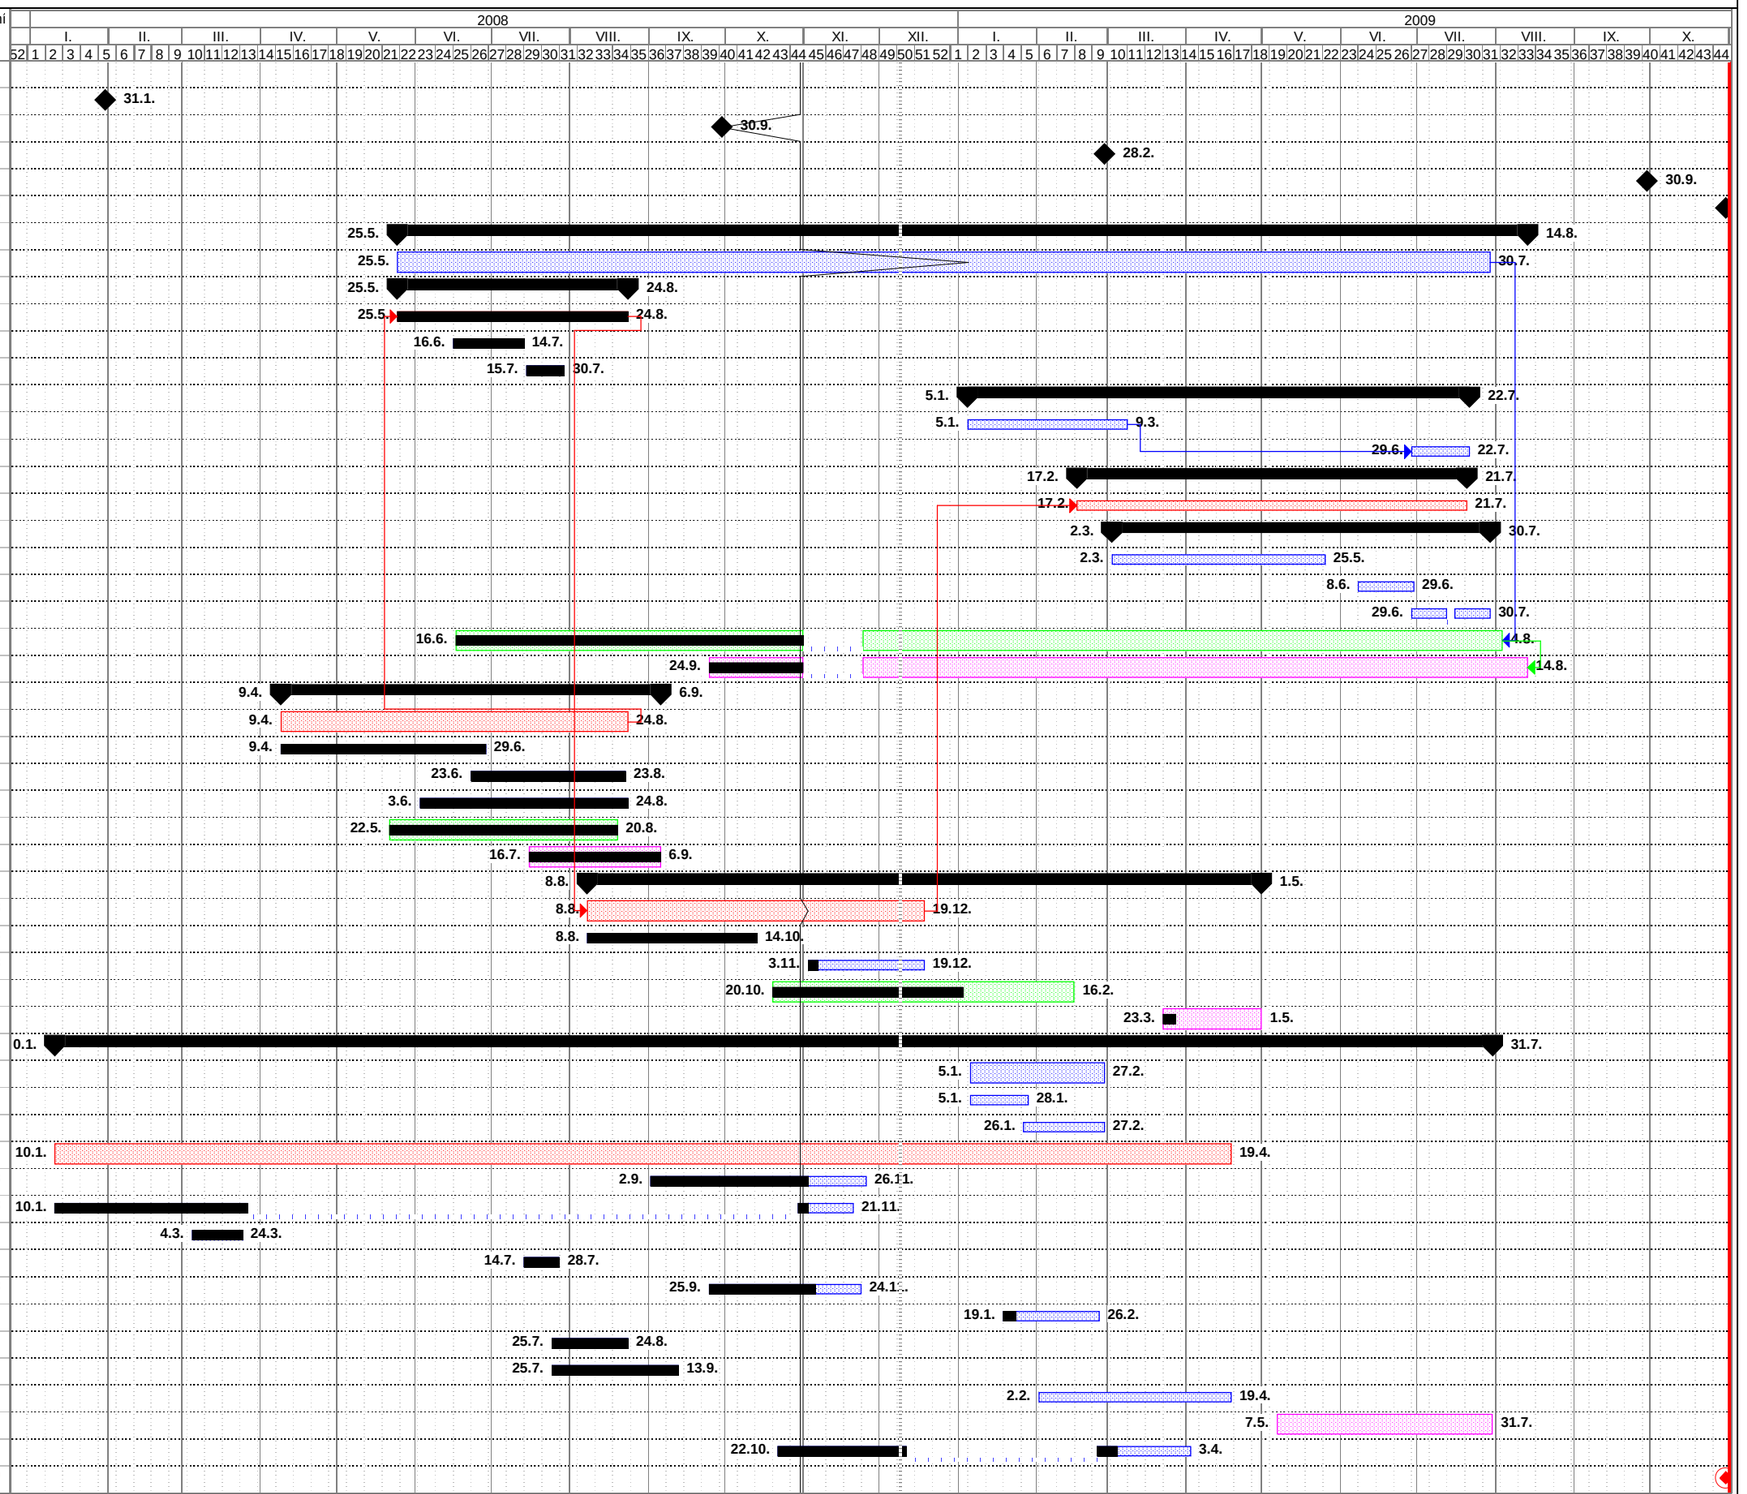

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
